


江差町立江差中学校改築工事の進捗状況について

平成 26 年7月
江差町教育委員会



完成予想パース

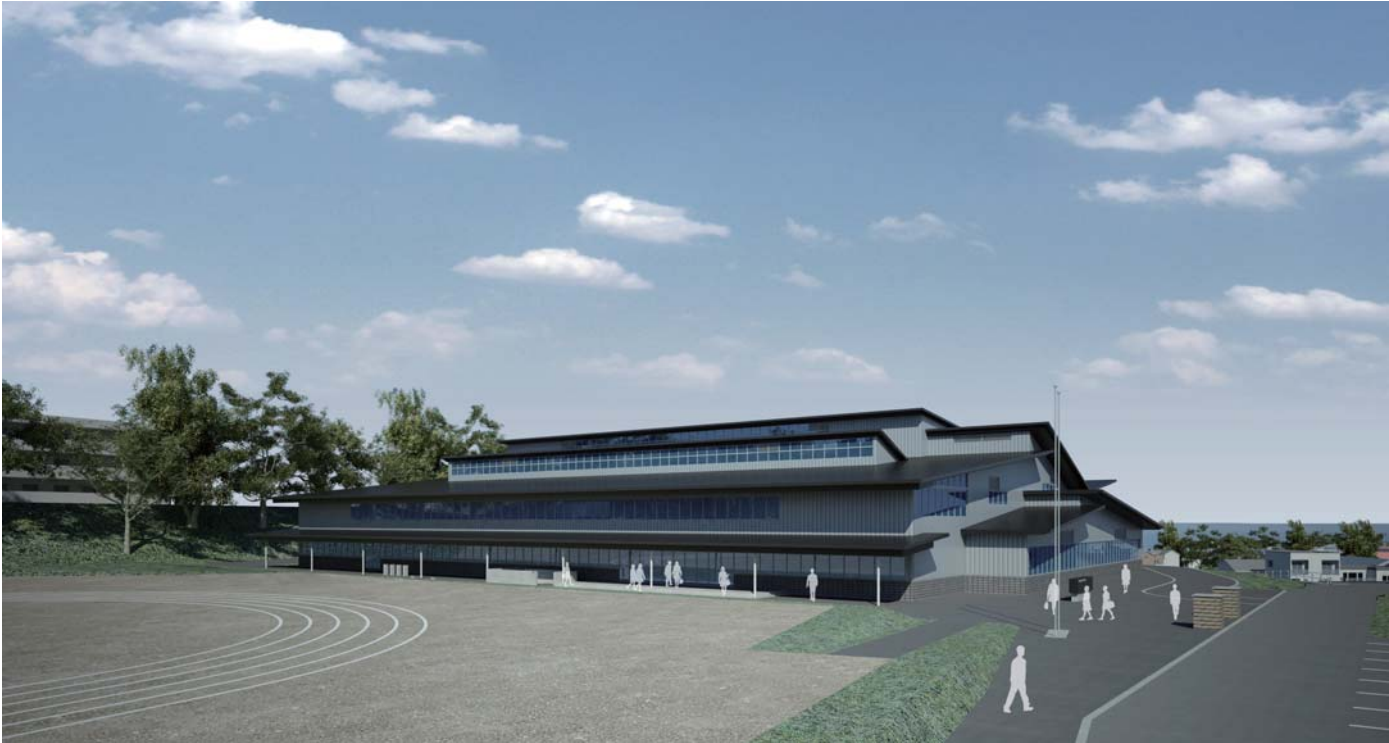

内観イメージ



施工状況（平成26年7月）

江差中学校の改築工事は、平成25年6月に着工してから1年が経過しました。校舎及び体育館の建設工事は25年度末で全工種とも約40％が完成しています。26年6月末には52～70％が完成しており、予定通り26年11月末完成見込みとなっています。

校舎及び体育館の完成後は、現校舎の解体とグラウンド整備を実施し、27年度にすべての工事が完成する予定です。



コンクリートが打ちあがり、建物の概形がわかるようになりました。窓のサッシも付き、内装工事や設備工事が進んでいます。

工事種別	進捗率	予定
建築主体工事（Ａ工区）	68.0%	67.0%
建築主体工事（Ｂ工区）	55.0%	55.0%
電気設備工事（強電）	52.0%	52.0%
電気設備工事（弱電）	60.0%	60.0%
暖房換気設備工事	53.0%	53.0%
給排水衛生設備工事	70.0%	70.0%

進捗状況（平成26年6月末）
